
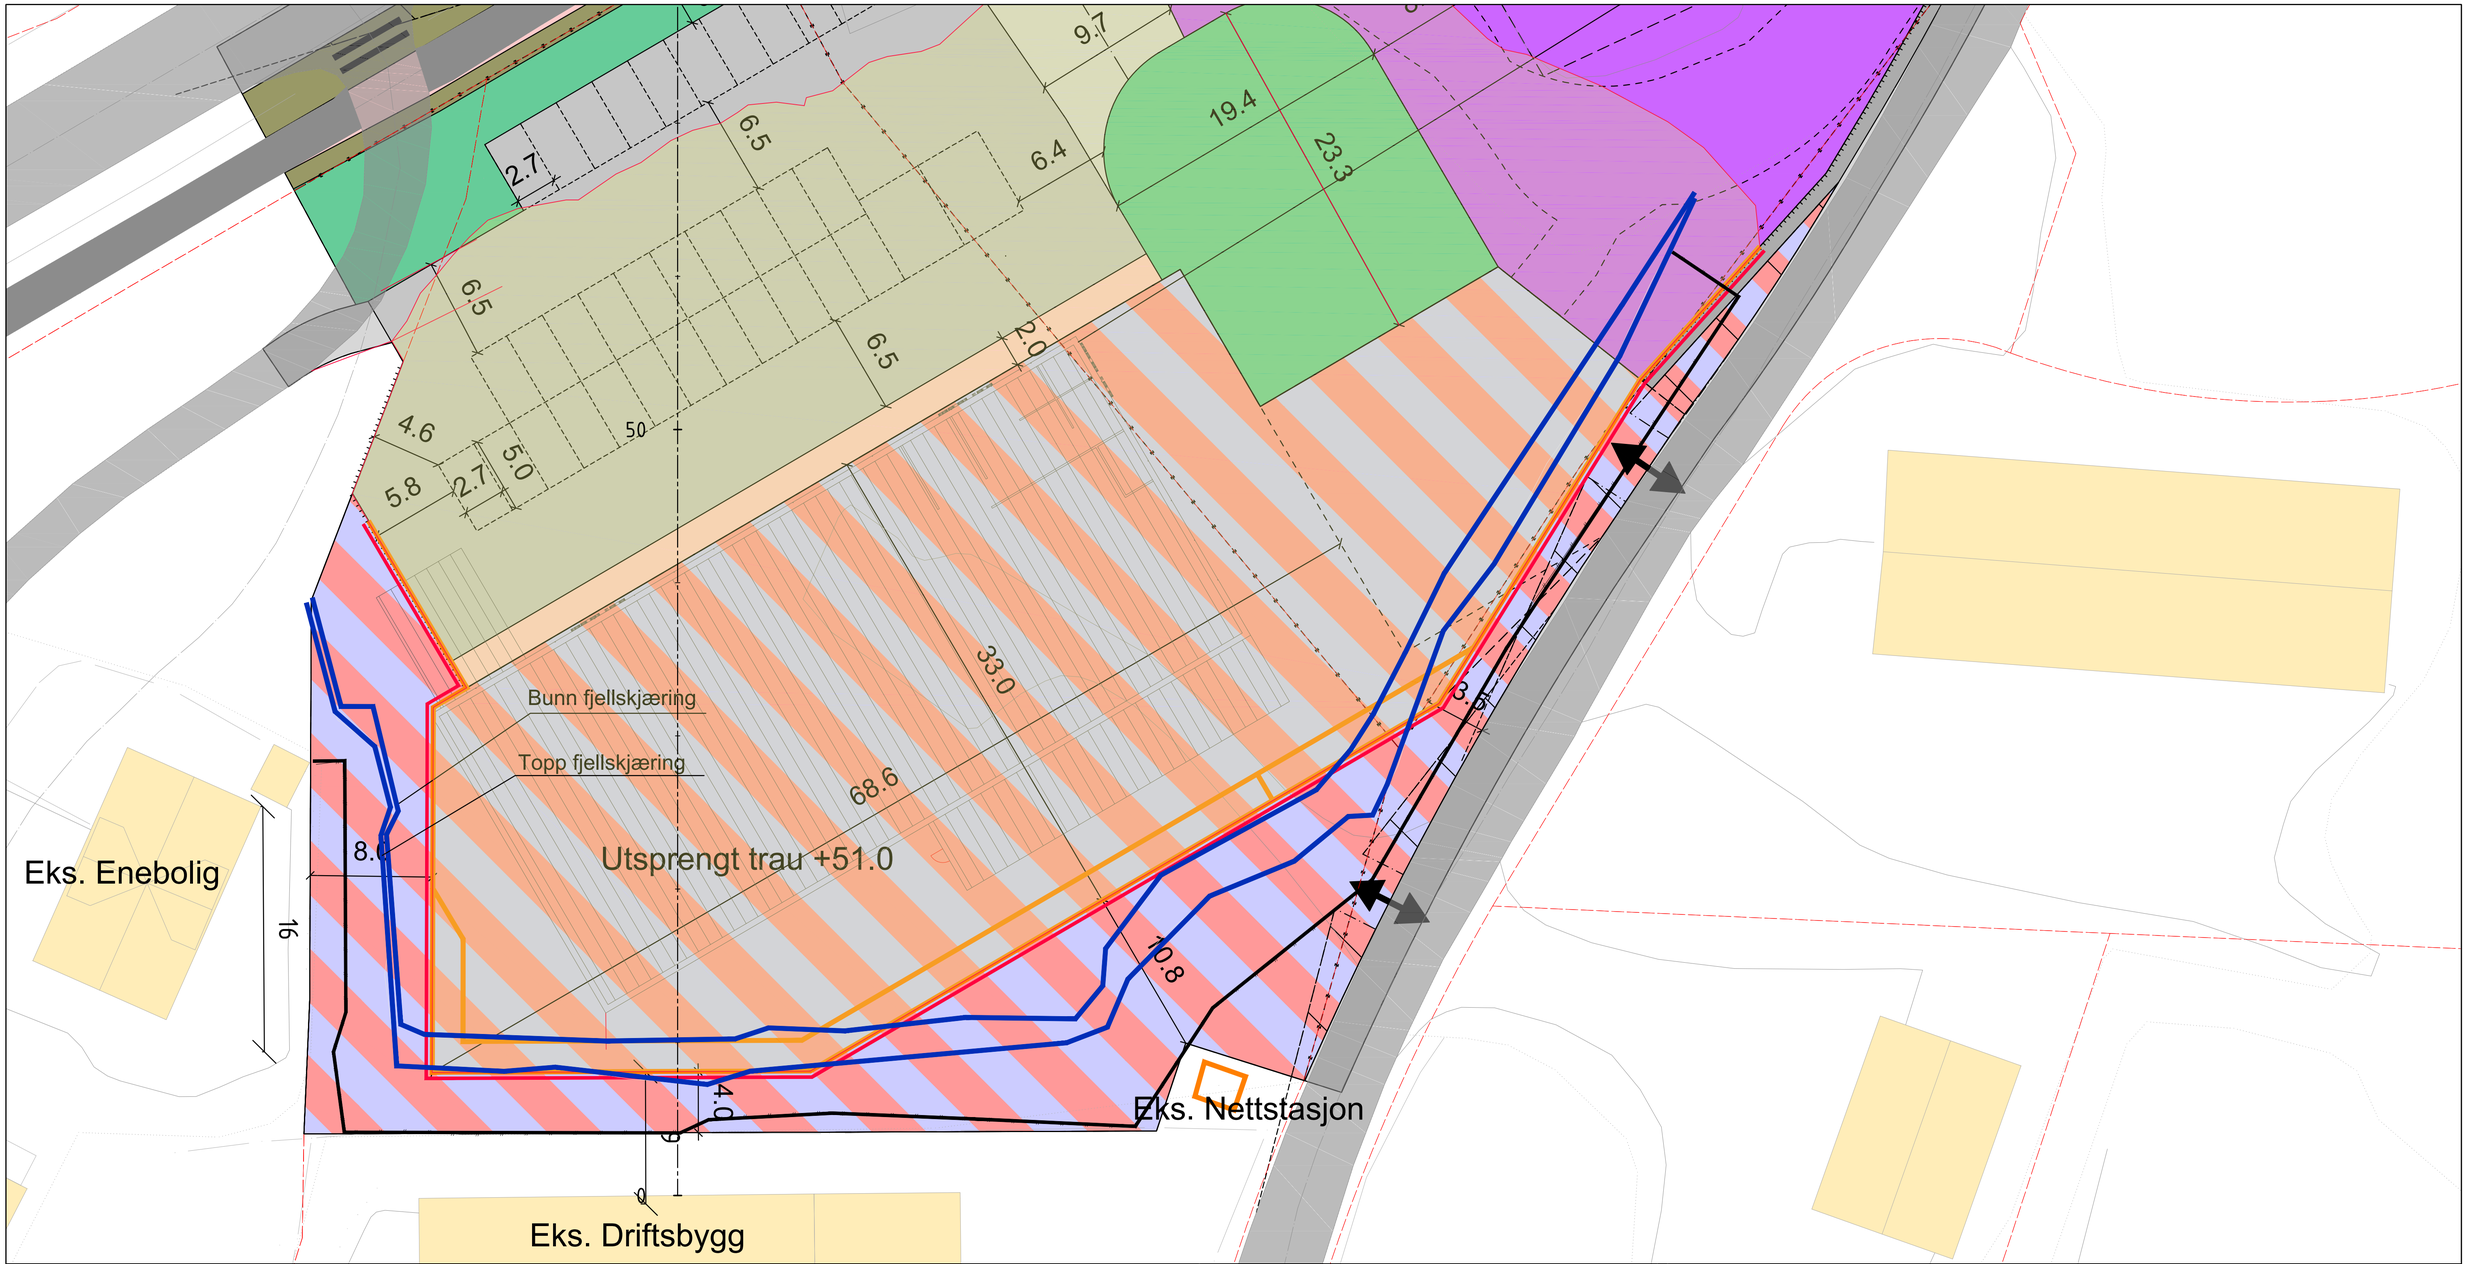


	Veggvinkel rundt 50-52 grader					
Pallhøyde [m]	10	11	12	13	14	15
Hyllebredde [m]	8	9	10	10,5	11,5	12

Tabell 1: Eksempler på pallhøyde og hyllebredde ved veggvinkel på om lag 51 grader.

Sikringshyller:
For å redusere sjansen for at mennesker, husdyr og tamrein utsettes for fare etter at driften er avsluttet, kan et tiltak være å benytte sikringshylle. Ved å etablere en lavere sikringshylle på toppkant av uttaket, reduseres fallhøyden. Høyden på sikringspallen bør være maks 2-3 m, avhengig av hvilken pallvinkel som benyttes ved avslutning, maksimalt henholdsvis 90-60 grader. Der risikovurdering tilsier det, skal sikringshylle kombineres med ytterligere sikringstiltak som første barriere.



Figur 7

Fjellskjæring

Sikringsgjerde H=1,2 meter

Fjellskjæring - Asbuilt

Sikringsgjerde - Asbuilt
